

| | | |
|---|---|--|
| 社長 | 事務長 | |
|  |  | |

【 議 事 録 】

作成者： 小野

作成日： 2025 年 3 月 7 日

| | | | |
|----------------|-------------------------------|---|--|
| 会議名 | センター会議 | | |
| 開催日時 | 2025 年 3 月 6 日(木) 16:15~16:30 | | |
| 場所 | 掛川電気会館 2 階会議室 | | |
| 出席者 (計 6 名) | 直営班 | : (寺井電機)市川さん (浜電工業) 加茂さん (中泉電気) 寺井社長 | |
| | センター | : 中村社長、鶴田常務、小野 | |

議題1: 他電力の N 相への DV 線接続色について

資料別紙

センター中村社長より、直営班(寺井電機)が出向した現場で発生した事象について、資料に沿って説明した。

(今回の事象については、直営班に否が無い旨、中電 PG(株)天野副長より事前により説明あり)

議題2: 直営班安全パトロール結果の共有

資料別紙

直営班の安全パトロール結果を資料に沿って説明し共有した。

- ・2024 年 11 月~12 月(パトロール者:センター高塚さん)
- ・2025 年 1 月 21 日(パトロール者:中電 PG(株)掛川支社)

次回センター会議 : 未定

上記内容について、株式会社掛川電気引込工事センター直営班の了解を得られました。

寺井電機株式会社 代表取締役社長 小林 美喜 (代理)市川 俊 ㊞
浜電工業株式会社 代表取締役社長 松田 匡介 (代理) 加茂 厚作 ㊞
有限会社中泉電気工業 代表取締役社長 寺井 将晃 ㊞

他電力の N 相への DV 線接続色の違いについて

センター直営班が出向した現場で下記の事象が発生しました。

中部電力 PG(榊掛川支社 配電建設 G 天野副長より下記内容を直営班で共有するよう指示がありましたので、確認願います。

【申込内容】

単 2 20A / 単 3 40A

申込工事店：東京電力管内の工事店

引込線張替・メーター取替は引込工事センター施工

【概要】

- 1 第 1 支持点～第 2 支持点～メーター (CV) までの幹線を申込工事店にて施工済
- 2 引込工事センターにて屋内ブレーカの「切」を確認
メーター新設
引込線新設
工事完了後に屋内ブレーカにて電圧測定時に異常電圧を確認
- 3 SMが不良となり取替を実施 (取替は中電 PG(榊様にて対応)

【原因】

第 2 支持点の DV と CV の接続点にて、以下の接続となっていた。

DV CV

黒 黒

緑 赤


青 白

現地に申込工事店がいたため、確認したところ、「東京電力管内では N 線は DV 青に接続するようになっている」とのでした。

今回は送電前の確実な電圧測定を行ったことにより、お客さま機器の損傷を防ぐことができましたので、今後も確実にお願いします。

インターネットを見ても、電力会社によって N 相への接続の色が異なることが掲載されていました。

单相2線式 100V / 单相3線式 100V・200V

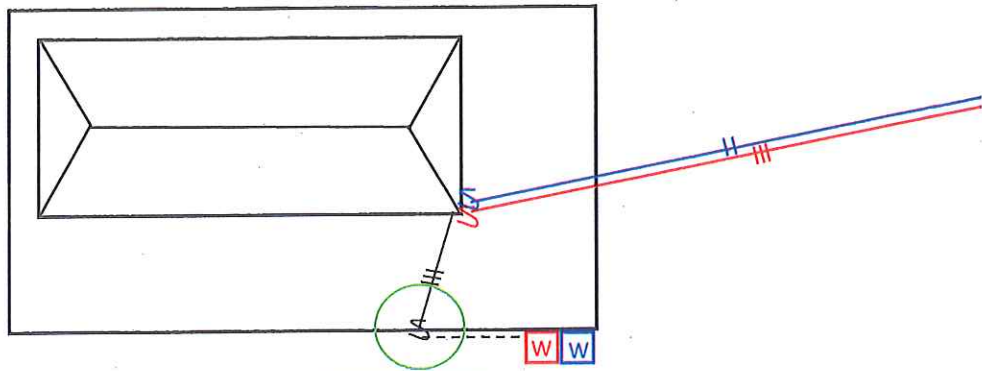

接続相

| | |
|-----|-----|
| DV線 | CV |
| 黒 | — 黒 |
| 緑 | — 赤 |
| 青 | — 白 |
